



安浦町市原地区ほ場整備事業(2工区)の工事完成について

平成30年7月豪雨災害復旧事業である、安浦町市原地区におけるほ場整備事業のうち、残りの2工区の工事が完成しましたのでお知らせします。

これにより、安浦町市原地区ほ場整備の工事は全て完了しました。

なお、本年3月に完成した「3工区」は、一時利用地指定*の手続きを行うことで同年4月から利用可能となっており、「2工区」についても同様に、令和6年3月又は4月から利用可能となる予定です。

また、個別の事情により残っている農林業施設の災害復旧工事はこの度の工事の完成により、本年12月末で完了率が98.6%となり、残りの9箇所についても令和5年度中に工事が完了する見込みです。

※一時利用地指定…工事着手してから換地処分までの間、従前の土地にあった使用収益関係を停止すると同時に、他の土地を従前の土地とほぼ同じ条件で耕作等使用収益させることをいいます。
なお、「1工区」については、令和2年1月に復旧し、利用可能となっています。

1 現在の工事請負契約状況

工事名	農地・農業用施設災害復旧工事(市原2工区)
契約の相手方	(株)岡本組(呉市安浦町中央1丁目3番19号)
工事契約期間	令和4年4月1日から令和5年12月27日まで
完成年月日	令和5年12月19日
契約金額	127,288,700円(税込)

2 今後の予定

換地処分に向けた確定測量や換地計画書作成等の作業を進めていきます。

3 完成後の写真等

別紙のとおり

4 参考

農林業施設の災害復旧状況(令和5年12月末時点)

施設区分	実施件数 A	着手済件数 B	完了件数 C	着手率 B/A	完了率 C/A
農道	53	53	52	100.0	98.1
林道	57	57	57	100.0	100.0
水路	65	65	62	100.0	95.4
ため池	8	8	8	100.0	100.0
農地	452	452	447	100.0	98.9
計	635	635	626	100.0	98.6

○安浦町市原地区ほ場整備事業（2工区）完成写真


①



②



土地改良事業計画概要図 (安浦町市原地区)

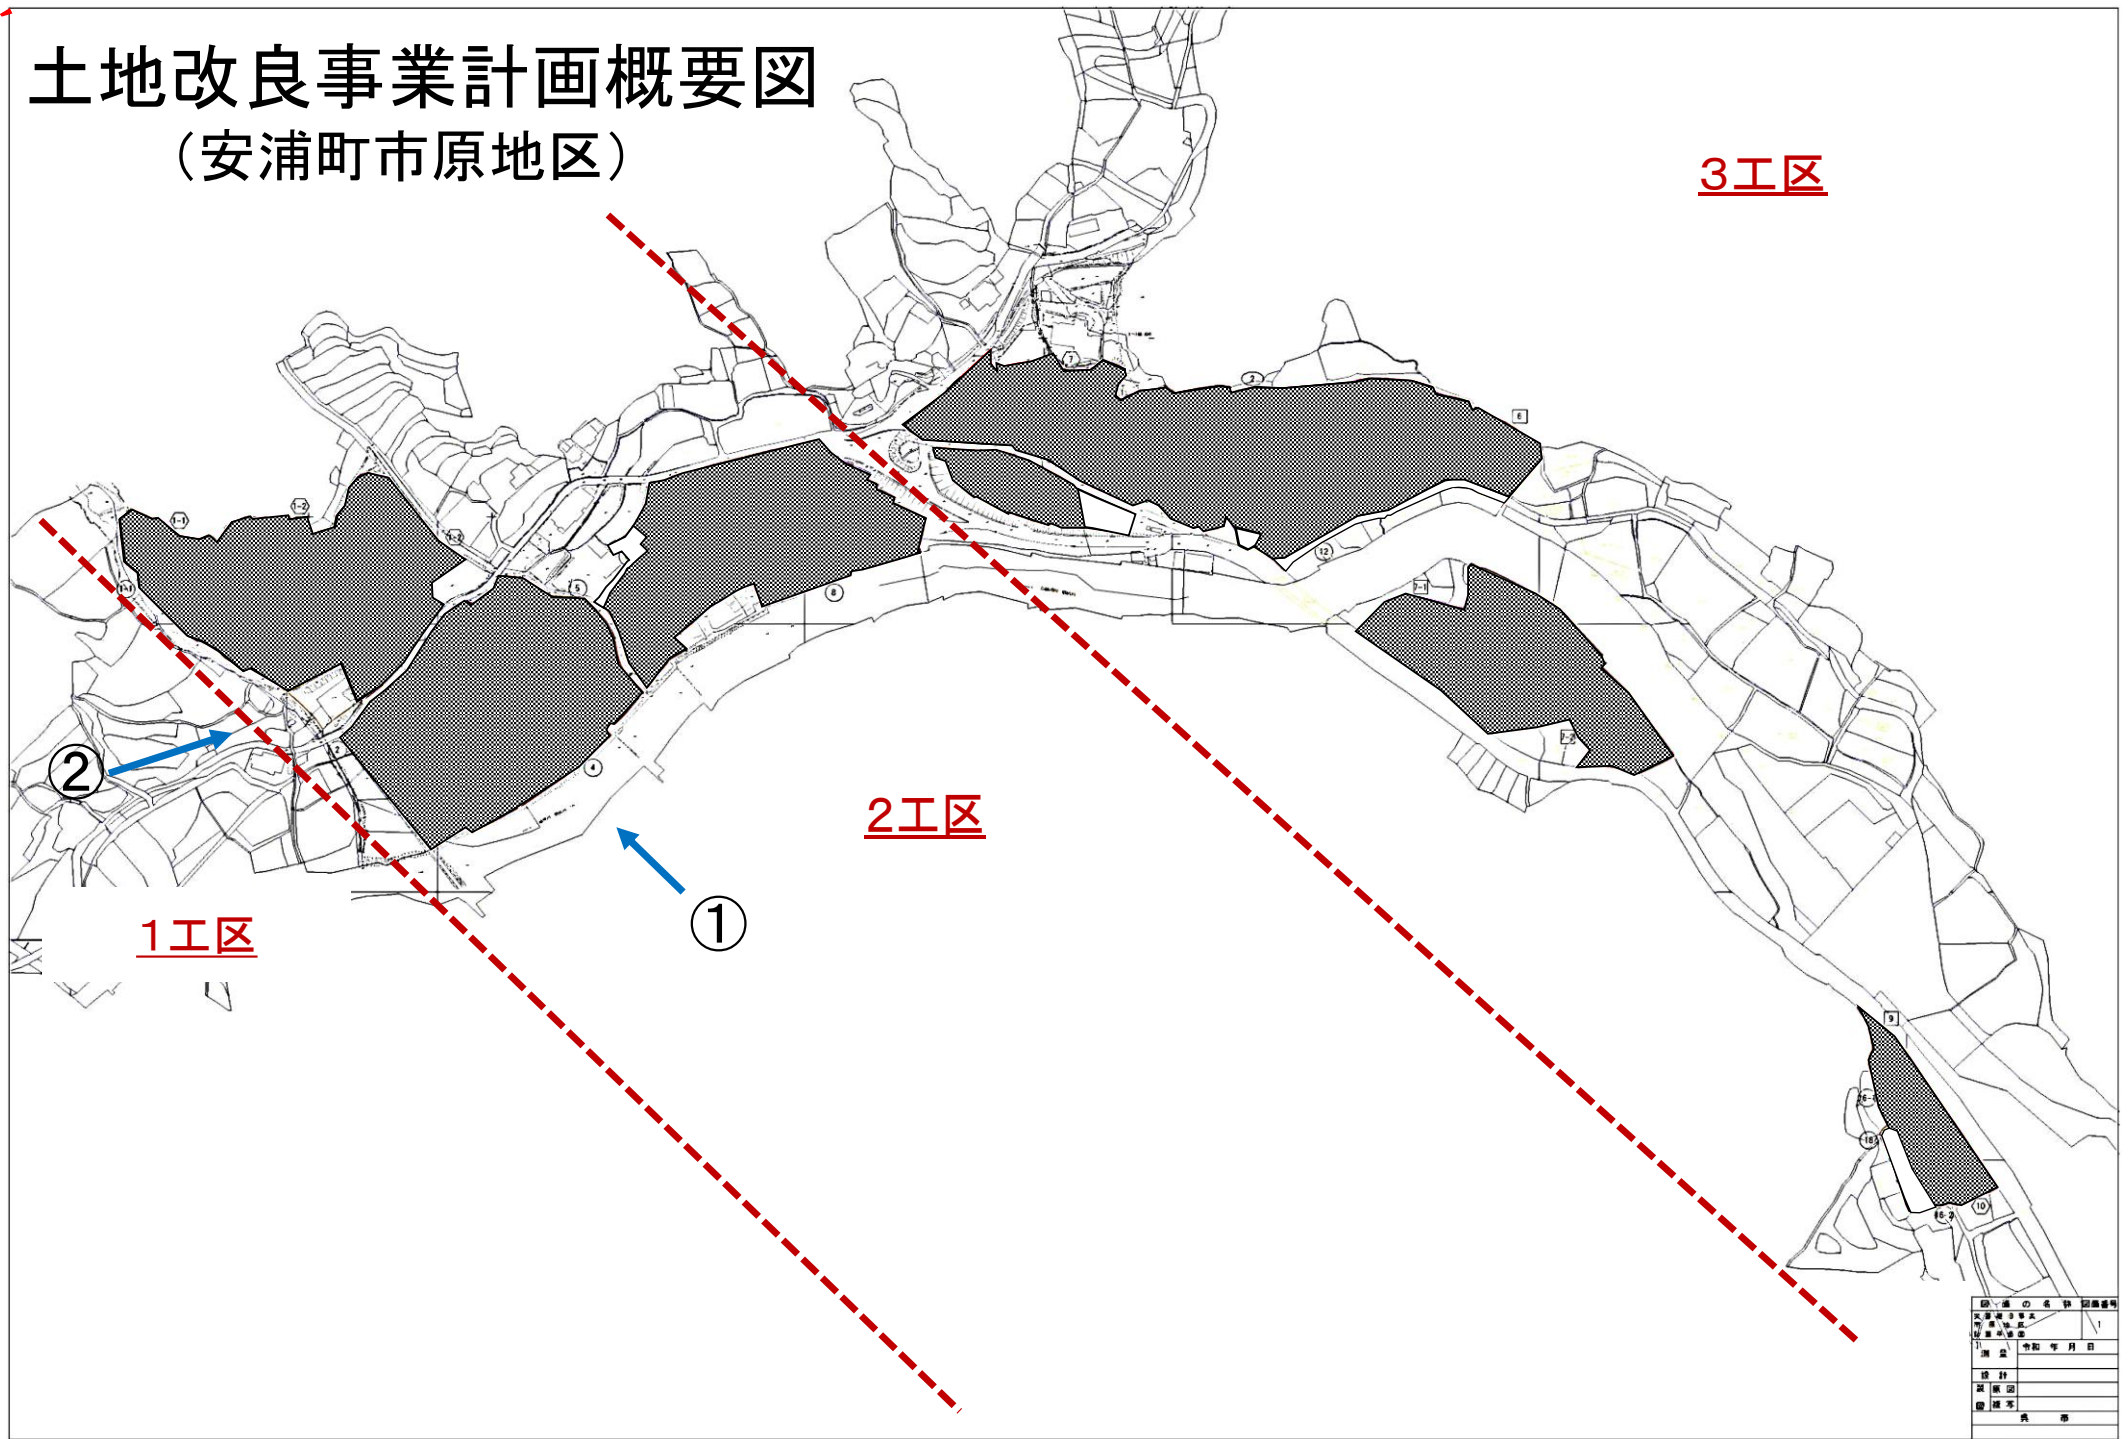

図名	土地改良事業計画概要図
作成者	安浦町建設課
作成日	令和 年 月 日
設計	
監理	
備考	
備考	
