

平成30年7月豪雨災害

発災から6年間の主な取組



安浦町市原地区ほ場整備の完成
(令和5年12月)



復興ミュージアムウェブサイトの構築
(令和6年3月)

令和6年7月5日
呉市災害復興本部

1 復旧・復興に関するこれまでの主な経過

平成30年9月11日

呉市災害復興本部 設置
(復興総室・プロジェクトの設置)

【同月26日以降】災害復興部長会議を原則、毎週火曜日に開催

平成30年10月26日

第1回呉市復興計画検討委員会 開催

※東大復興デザイン研究体の羽藤英二教授が座長を務め、平成30年度・31(令和元)年度に計5回の会議を開催

平成31年3月28日

呉市復興計画 策定

【平成30年12月～令和元年6月】
地区計画策定のためのワークショップ開催(天応・安浦地区)

令和元年9月27日

呉市復興計画(地区計画) 策定

令和6年3月28日

呉市が行う復旧事業(49事業)がすべて完了

2 復旧・復興に向けた基本理念と基本方針

【基本理念】

～災害に強い幸せで魅力的な都市を目指して～

- ① 被災者の方々が被災前の当たり前の生活を取り戻すこと
- ② 被災したインフラなどの早期の回復
- ③ 市民や企業が、イキイキ・わくわくと活動することができ、市民が今後も住み続けたいと思えるまち
- ④ 観光客が訪れてみたいと思えるような交流都市

【基本方針】

1 住まいと暮らしの再建

- 被災者支援
- 子ども・子育て支援
- 廃棄物・土砂処理

2 災害に強い安全・安心なまちづくり

- 土木施設等の強靱化
- 公共施設等の強靱化
- 上下水道施設の強靱化
- 交通基盤の強靱化

3 産業・経済の復興

- 地域産業の復旧・復興

4 今後の防災・減災に向けた取組

- 防災・減災に向けた体制の強化

3 復興計画における各事業の進捗状況

【基本方針】

【施策】

【事業数】

基本方針	施策	事業数					
		新規	継続	ほぼ完了(※)	完了	合計	
1 住まいと暮らしの再建	(1) 被災者支援		3	4	18	25	
	(2) 子ども・子育て支援		1		10	11	
	(3) 廃棄物・土砂処理				7	7	
2 災害に強い安全・安心なまちづくり	(1) 土木施設等の強靱化		23		18	41	
	(2) 公共施設等の強靱化		4	1	11	16	
	(3) 上下水道施設の強靱化		2	2	6	10	
	(4) 交通基盤の強靱化		5			5	
3 産業・経済の復興	(1) 地域産業の復旧・復興		8	0	13	21	
4 今後の防災・減災に向けた取組	(1) 防災・減災に向けた体制の強化		19	11	8	38	
		合計	0	65	18	91	174

※ 令和5年度末時点での進捗率が90%以上等の事業

復旧事業(49事業)は、令和5年度末ですべて完了

(呉市復興計画に基づく主な実施事業を計上：令和5年度末時点)

(参考) 令和4年度末時点

3	70	25	76	174
---	----	----	----	-----

4 住まいと暮らしの再建に向けた取組①

(1) 被災者の生活支援と住まいの再建

※復旧事業については「完了」

- 地域支え合いセンターは、支援対象である仮設住宅入居世帯等が、全て在宅生活に移行したため、**令和4年3月末をもって閉所**

被災者の生活支援・
見守り・心のケア

引き続き、保健師等による被災者の相談対応や見守り活動を継続して実施中

(2) 完了又はほぼ完了した主な事業

- 令和4年度までに完了
- ◆ 令和5年度完了
- ほぼ完了

取組区分	事業名
①生活再建支援	○災害弔慰金，災害見舞金等の支給 ■災害義援金の受付・配分 ○災害援護資金の貸付け及び利子補給 ■被災住宅の応急修理 ◆市税の減免 ■保険料，保育料，上下水道料金等の減免

※本資料は特段の表記がない場合、令和6年5月末時点の状況を示す。

4 住まいと暮らしの再建に向けた取組②

(2) 完了又はほぼ完了した主な事業

- 令和4年度までに完了
- ◆ 令和5年度完了
- ほぼ完了

取組区分	事業名
②恒久的な住まいの再建	<ul style="list-style-type: none"> ■ 住まいの再建に関する総合相談の実施 ■ 応急仮設住宅等への一時入居支援 ■ 被災者への中古住宅取得支援
③安心・安全な児童福祉施設の復旧支援	<ul style="list-style-type: none"> ■ 被災児童福祉施設の復旧支援
④児童・生徒の心のケア	<ul style="list-style-type: none"> ■ 心の元気を育てる体験活動の実施
⑤就学支援	<ul style="list-style-type: none"> ■ 被災児童・生徒の就学支援
⑥早急な家屋撤去と土砂等の撤去	<ul style="list-style-type: none"> ■ 半壊以上の被災家屋の公費撤去 ■ 被災家屋・土砂混じりがれきの撤去に関する費用償還 ■ 宅地内の堆積土砂・土砂混じりがれきの撤去 ■ 災害土砂の撤去・運搬・大分別
⑦災害廃棄物等の早期処理	<ul style="list-style-type: none"> ■ 災害廃棄物等の収集・分別・処分 ■ がれき混じり土砂の分別 ■ 災害廃棄物の海上輸送・処分

5 災害に強い安全・安心なまちづくりに向けた取組①

(1) 土木施設等の復旧・強化①

※復旧事業は「完了」

➤ 道路・公園・橋りょう・河川の災害復旧工事はすべて完了

※公共・単独災害復旧の合計(P6,P7)

□ 道路災害復旧【完了】

【実施件数:215件】

□ 橋りょう災害復旧

【実施件数: 17件】

着手済 17件
(17件)

100%

完了 17件
(16件)

(約94%)→100%

□ 公園災害復旧【完了】

【実施件数:12件】

□ 河川災害復旧

【実施件数:155件】

着手済 155件
(155件)

100%

完了 155件
(154件)

(約99%)→100%

※()は、令和5年5月末の進捗状況を記載。P7～P9も同様。

5 災害に強い安全・安心なまちづくりに向けた取組②

(1) 土木施設等の復旧・強化②

➤ 農道・水路・林道・農地・ため池の災害復旧工事はすべて完了

□ 農道災害復旧

【実施件数：53件】

着手済 53件
(53件)

100%

完了 53件
(52件)

(約98%)→100%

□ 水路災害復旧

【実施件数：65件】

着手済 65件
(65件)

100%

完了 65件
(53件)

(約81%)→100%

□ 林道災害復旧【完了】

【実施件数：57件】

□ 農地災害復旧

【実施件数：452件】

着手済 452件
(452件)

100%

完了 452件
(441件)

(約97%)→100%

□ ため池災害復旧【完了】

【実施件数：8件】

5 災害に強い安全・安心なまちづくりに向けた取組③

(1) 土木施設等の復旧・強化③

- 国・県による砂防・治山事業の実施
- 砂防・治山事業の緊急事業分の工事は全箇所完了し、再度の災害防止のための工事を実施中


○緊急事業 … 二次災害を防止するための工事



泉谷川砂防堰堤(安浦町中畑)
【増設分：令和6年5月完成】
広島県提供


□ 砂防事業（国・県事業）

【計画数：35か所(国8・県27)】



□ 治山事業（国・県事業）

【計画数：67か所(国7・県60)】



砂防・治山事業（強靱化）の進捗状況

国・県による砂防・治山事業（強靱化）の進捗状況を市ホームページで公表(概ね1か月ごとに情報を更新)

5 災害に強い安全・安心なまちづくりに向けた取組④

(2) 公共施設等の強靱化

- 市立学校施設について、令和6年度末までの耐震化完了（耐震化率100%）を目標に耐震化整備を実施

※復旧事業については「完了」



呉中央小学校耐震補強

(3) 上下水道施設の復旧・強化

- 水道施設・下水道施設・工業用水道施設の災害復旧工事はすべて完了
- 現計画における水道施設・下水道施設の強靱化はほぼ完了

※復旧事業については「完了」

□ 水道施設の本復旧 【完了】

【実施件数：271件】

□ 工業用水道施設の本復旧 【完了】

【実施件数：4件】

□ 下水道施設の本復旧

【実施件数：37件】

着手済 37件
(37件)

完了 37件
(36件)

100%

(約97%)→100%

5 災害に強い安全・安心なまちづくりに向けた取組⑤

(4) 交通の強化・確保・渋滞対策

□ 災害に強い交通体系の整備

- 広島呉道路4車線化整備 → 早期整備について関係機関に要望
- 主要地方道呉平谷線（上二河～此原工区）の整備
此原工区は完成（令和5年3月）
→ 残る上二河工区の早期整備について関係機関に要望

□ 災害に備えた新たな交通拠点の整備

- 旧そごう呉店既存建物の解体着手（令和5年4月）
- 呉駅交通ターミナル整備設計委託契約（令和5年6月）【国】
- 呉駅交通ターミナル一般車送迎場実施設計委託契約（令和5年10月）【市】



国のバスタプロジェクトの一環として、道・港・駅・まちが一体となる防災機能を備えた次世代型総合交通拠点の整備


複合施設の整備に向けた旧そごう呉店解体工事

6 産業・経済の復興に向けた取組

(1) 観光の復興

- 各年7月の市内総観光客数は、豪雨災害と新型コロナウイルスの影響により大きく減少
- 令和5年7月の市内総観光客数は、発災前の65%まで回復
- 元気な呉をPRし、積極的に観光客を呼び戻す取組を推進

各年7月の市内総観光客数

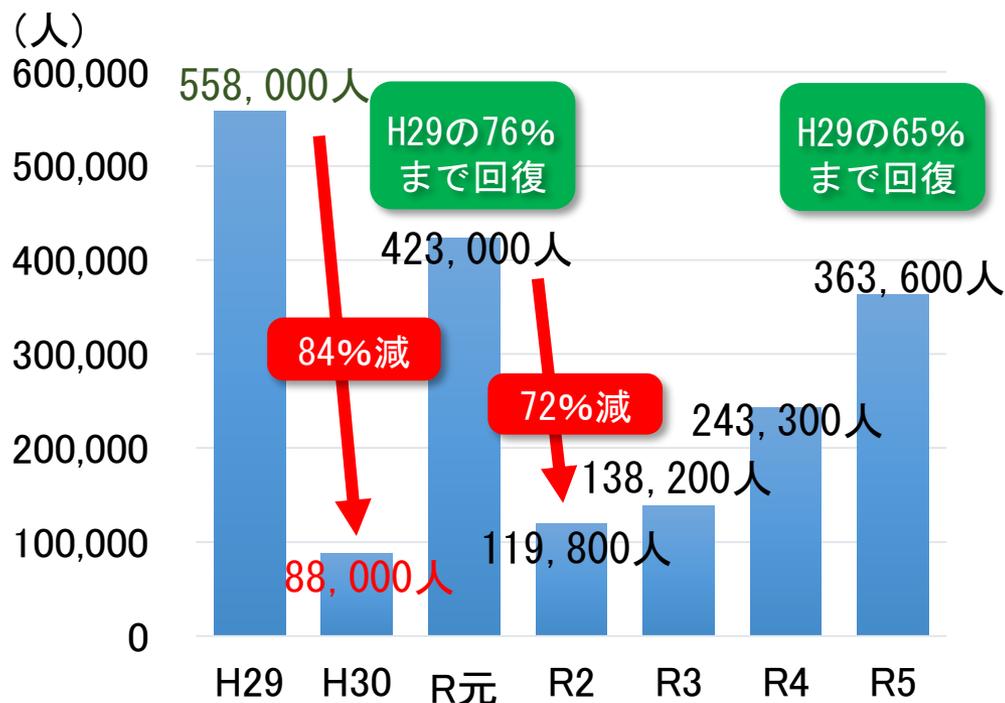

観光復興イベント

- 呉ご当地キャラ祭
(令和5年10月14日・15日)



呉ご当地キャラ祭

7 今後の防災・減災に向けた取組①

- 避難情報等の伝達方法の見直し，分散備蓄の実施，復興ミュージアムなど，防災力の向上に向けた取組を推進

(1) 防災力の向上

□ 一斉電話伝達サービス

固定電話等に向けた避難情報伝達サービスの導入
(令和2年度～)

□ 備蓄品目の充実

オストメイトトイレの設置されていないまちづくりセンターへ災害用のオストメイトトイレを配布
(令和5年度)

(2) 災害の記憶の継承

□ 呉市学校防災週間における取組

呉市立小中高等学校において，豪雨災害の記憶を次世代へ継承することを目的に，毎年7月6日を含む1週間を「呉市学校防災週間」として設定し，各学校の実情に応じて防災に向けた取組を実施

7 今後の防災・減災に向けた取組②

□ 呉市復興ミュージアム

- ・ 豪雨災害の被災状況等を記録した，災害記録誌・映像資料・展示パネル説明版・復興ウェブサイトを活用し，災害の記憶を風化させることなく未来へ継承していく取組を「呉市復興ミュージアム」と位置づけ，災害の記憶を教訓として活かしていくとともに，市民をはじめとした多くの方の防災意識の向上に取り組む。



説明版設置(安浦市民センター)



パネル展(昭和市民センター)

□ 一時避難場所・記憶を継承する場の整備

- ・ いなしふれあい広場（安浦地区）の整備（令和5～6年度）
 - ※ 7月13日に地域の住民等を招き完成式を開催予定
- ・ （仮称）天応西条第2公園の整備（令和6年度）

引き続き，防災・減災に向けた取組を推進
