

庁舎建設関連事業について

1 旧庁舎解体撤去・雨水貯留施設整備工事の進捗状況（平成29年7月末現在）

(1) 工事進捗率 約74%

【完了した工事】

〈旧庁舎解体撤去工〉

- 庁舎棟解体 … 平成29年1月中旬（建物部分の撤去）
- 議会棟解体 … 平成29年1月末（建物部分の撤去）
- 地下解体等 … 平成29年4月中旬（はりや壁等の撤去及び補強）

〈雨水貯留施設整備工〉

- 雨水管路整備 … 平成29年6月末

【進行中の工事】

〈雨水貯留施設整備工〉

- 雨水貯留施設整備 … 平成30年4月完了予定  
 （地下ピットの補強，基礎ばりの施工など）

【今後の工事予定】

- 外構等附帯構造物撤去 … 平成30年2月から  
 （階段，スロープ，アスファルトなどの撤去）



(2) 今後のスケジュール

		平成29年度												平成30年度														
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
旧庁舎解体撤去及び 雨水貯留施設整備		■																										
参 考	来庁者駐車場整備																											
	北側市道からの流入管整備																											

部分使用開始


第1工区

第2工区

## 2 来庁者駐車場整備区域の概要

来庁者駐車場整備区域の一部が臨時駐車場（朱線）と重なるため、2工区に分けて施工します。

第1工区（140区画）完成後は速やかに部分使用を開始し、第2工区に着手します。第2工区工事期間中は、送迎車等が安全に転回できる場所が必要となるため、公園側に臨時転回場を設けます。

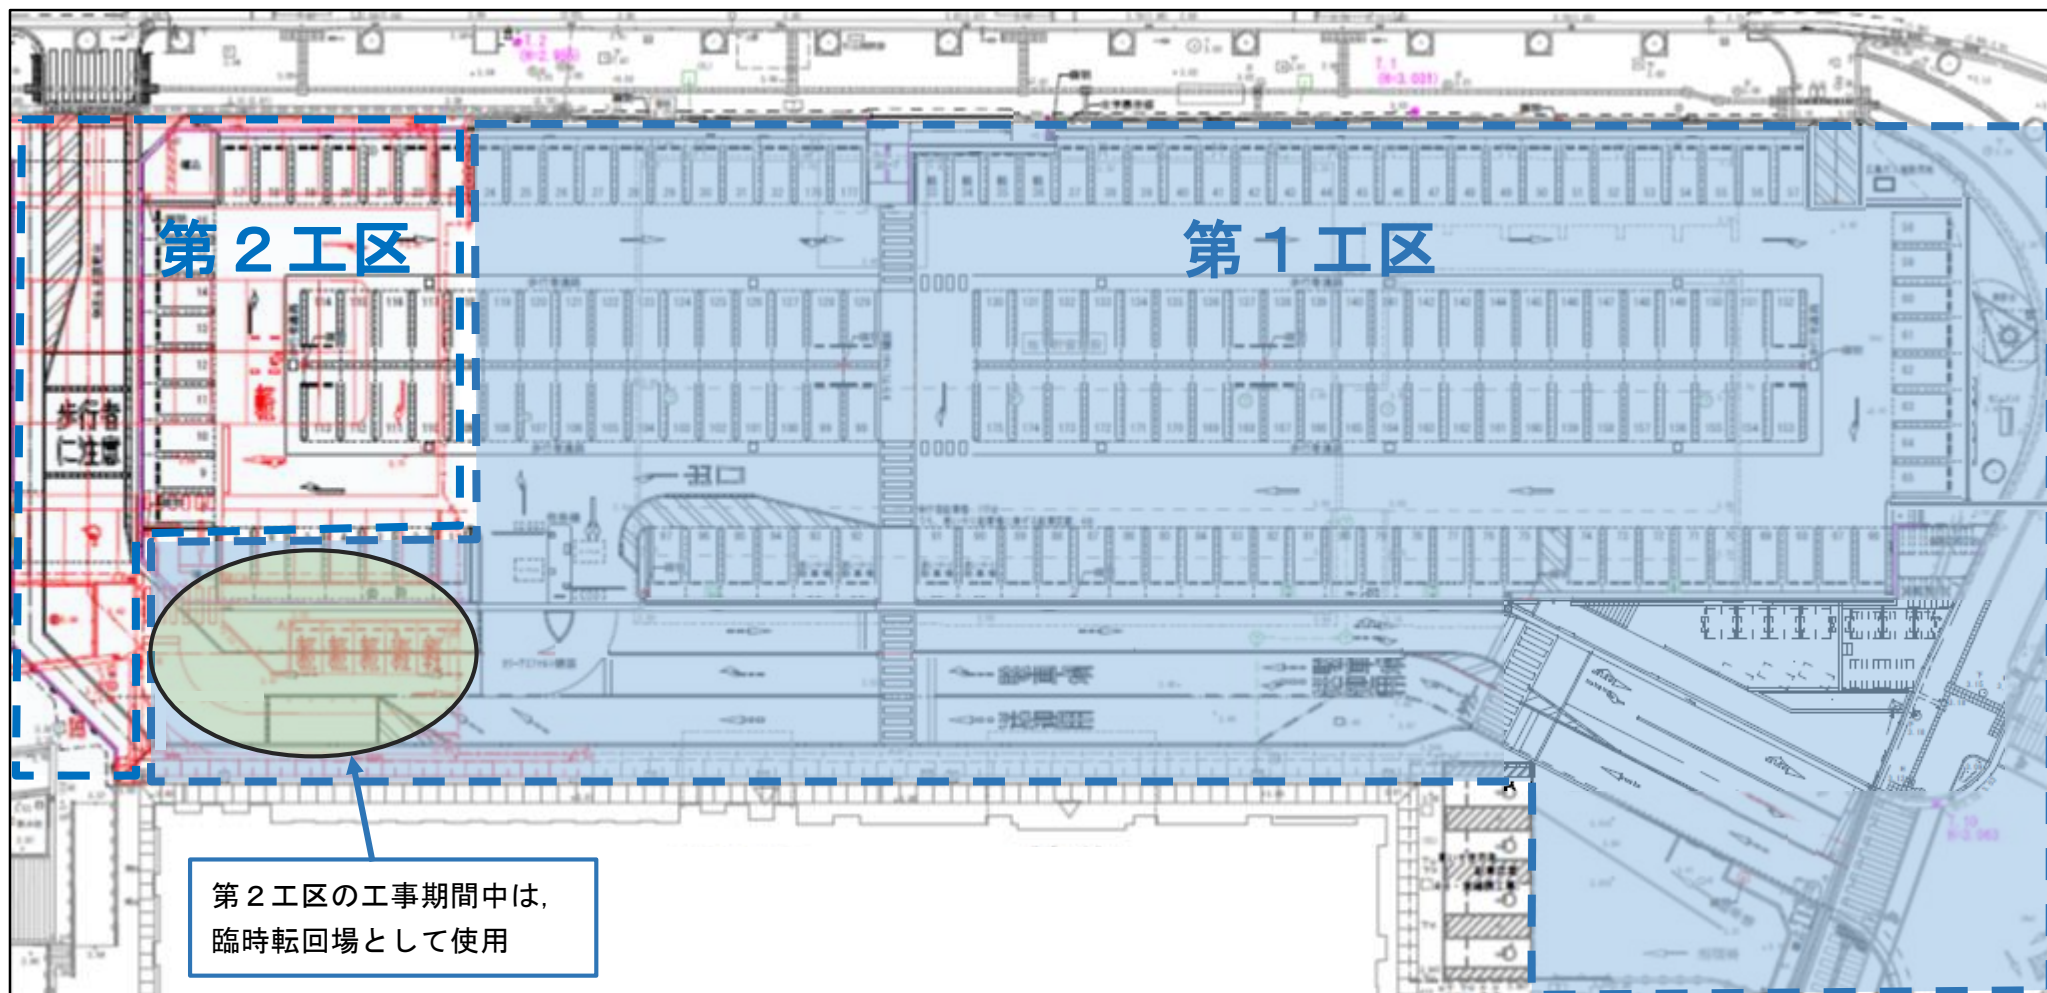

### 3 来庁者駐車場の整備内容

(1) 駐車区画数 181区画

- うち
- 身体障害者等用 4区画
- 思いやり駐車場 4区画

(2) 出入口

- ・蔵本通り側に出入口
- ・福祉会館側は信号機制御による出口のみ

(3) 駐輪区画数 53区画

- (内訳)
- 自動二輪車 11区画
  - 自転車 42区画

(4) その他

- ・タクシー待機スペースを設置
- ・大型車両駐車スペースを設置
- ・防犯カメラを設置
- ・事前精算機を導入

